



## Lycée Français Prins Henrik – Copenhague

### CR du conseil d'administration du 30 Aout 2018 à 17h30

#### 1. Validation du PV du précédent CA

Le PV a été validé et mis en ligne avant les vacances d'été.

#### *Points sur la rentrée*

##### Suivi des inscriptions/réinscriptions :

Total de 927 élèves, soit plus 40 élèves par rapport à l'année dernière. Le lycée passe à 100 élèves pour la première fois, avec deux classes de première. Notre pyramide des âges se consolide ce qui est un très bon signe pour notre lycée. LC produira le nombre d'élèves inscrits au DFB pour le prochain CA.

- Bourses « LFPH » : Nouvelle campagne de bourse les dossiers sont à retirer sur le site internet de l'école. Les conditions d'obtentions sont en ligne. Le CA rappelle que cette bourse est destinée strictement aux parents qui ne peuvent pas faire appel aux bourses françaises.

## Travaux

### Points sur les travaux réalisés / en cours

Travaux	Budget approuvé	Devis (DKK)	Réalisé (DKK)	Commentaires
Construction Foyer	1 000 000	1 502 500	En cours	100 kDKK de frais supplémentaire suite principalement à demande complémentaire de la commune sur l'installation de fenêtre à ouverture automatique en cas d'incendie Travaux en cours - finalisation prévue pour mi-septembre
Rénovation 3 cages d'escaliers	1 600 000	500 000	486 050	Par rapport à juin : 6.050 de complément pour la peinture des portes qui n'avaient pas été intégrées au devis 80.000 DKK rénovation sols et carrelages vestiaires gymnase
Rénovation gymnase	600 000			
Garages vélos supplémentaires	200 000	0	200 000	Travaux finalisés
Nouveau portail surélevé	300 000	260 000	0	Væmedamsvej : erreur de mesure de la société nécessitant de commander un nouveau portail à leur frais Frederiksberg Alle : portail installé Badges : seront installés sur les 2 portails en même temps
Rénovation des sols (cantine et toilettes)	300 000	0	80 656	Travaux finalisés
Peintures des portes et couloirs	100 000	5 000	5 000	Travaux finalisés

Travaux	Budget approuvé	Devis (DKK)	Réalisé (DKK)	Commentaires
Rénovation toiture bâtiment A	800 000	0	0	Le remaniement complet de la toiture du bâtiment A ne sera pas effectué. Les réparations nécessaires seront effectuées via ce budget au fur et à mesure.
Rénovation passerelle	400 000	100 000	16 988	Travaux finalisés
<b>Travaux complémentaires</b>				
Serrures sur les deux sites		90 000	En cours	Reste quelques ajustements - facture à recevoir pour chacun des 2 sites
Nouvelle classe		181 948	178 438	Budget autorisé en CA 200 kDKK TTC
Réaménagement admin		242 726	233 221	Budget autorisé en CA 250 kDKK TTC
Déménagement BDC		23 125	23 125	
<b>TOTAL</b>	<b>5 300 000</b>	<b>2 207 500</b>	<b>1 223 477</b>	

*NBS remarque que les travaux effectués ont coûté bien moins que leur estimation, particulièrement la passerelle qui est passée à un budget de 400,000 initial à 100,000 Dkk de travaux. LC explique que cela est dû au fait que le budget était pour refaire la passerelle à 100% mais après étude, la passerelle n'a pas de problème structurel. Les vitres pour l'étanchéité et l'intérieur ont été refaites et cela en partie par l'équipe des pedels, ce qui a permis cette économie.*

Photos des [travaux sur le FB de l'école](#)


### *Travaux cours bilan final*

- Travaux finalisés et comptes arrêtés.
- Coût total du projet tel que pris en compte dans le projet subventionné par la fondation AP Møller : 6.820.825 DKK vs donation de 6.800.000 DKK (dépassement de 0,3% par rapport au budget).

NBS indique qu'elle estime que le projet a été très mal géré et qu'elle n'est pas satisfaite par les résultats, au vu du montant alloué aux travaux par la subvention.

- Dans le cadre du projet cour, certains travaux de maintenance et amélioration ont été réalisés. Une partie des coûts ont été à la charge de la SCI (88 kDKK), principalement pour l'asphalte sur l'accès véhicules via Frederiksberg Allé. D'autres travaux ont été imputés sur le budget de travaux et maintenance du Lycée (total de 649 kDKK), notamment pour l'installation des emplacements vélos sur Frbg Allé + asphalte sous le balcon du voisin et sous la zone abritée de la cour, la sécurisation sortie de secours Værnedamsvej en cas d'inondation, le réhaussement des clôtures à 2,40 m / 2,50 m (prise en charge à hauteur de 1,8 m dans le projet couvert par la donation), demande d'intervention le week-end pour certains travaux

Points financiers :




CA du 30 août 2018



Point financier - juin 2018




Suivi salaires 2018



Les salaires des Pedel/ménages sont inférieurs car recrutement retardé. A ajuster en budget rectificatif (BR).

Le salaire Gymnasium est supérieur en raison d'une prime versée en mars qui sera amortie sur le reste de l'année.




CA du 30 août 2018




Point financier - juin 2018



Subventions 2018

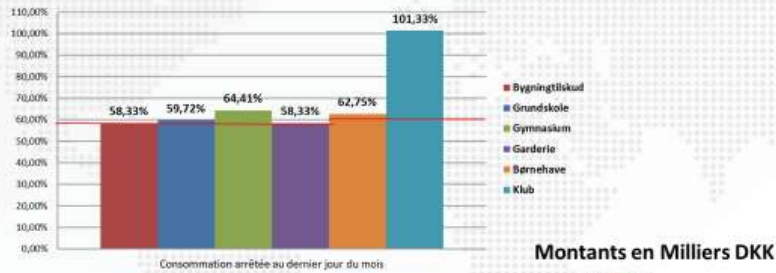

Les recettes du klub sont bien supérieures aux recettes budgétisées. Il conviendra de mettre à jour lors du BR de septembre.



### *AGE du 18 Septembre*

La convocation a été envoyée et les premiers documents sont en ligne sur le site.  
La présentation sur le projet immobilier a été vue et amendée par le CA elle sera mise en ligne dans le courant de la semaine prochaine.

Jusqu'à présent il y a deux points de votes :

1. Changement d'un article des actuels statuts permettant le vote à distance.
2. Jean-thomas Meyer doit il démissionner ?

NBS remarque que selon le fonctionnement du CA, ce n'est pas le président seul qui prends des décisions mais l'ensemble du CA et que les parents ont la possibilité de convoquer une AGE pour remplacer le CA.

### *Date de l'AG d'octobre*

Merci de penser déjà à envoyer vos candidatures au CA

8 Octobre 2018 17.30

Au cas où un nombre insuffisant de candidatures seraient reçues, L'AG retrouvera son fonctionnement précédent qui consiste à élire les nouveaux membres parmi ceux qui se présentent le soir même.
